


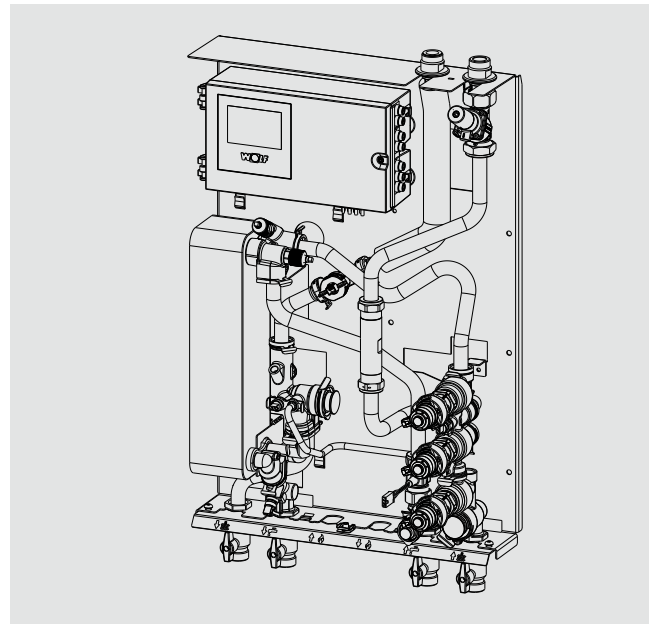

DE

Inbetriebnahmeprotokoll
WOHNUNGSSTATION
CAT-2-CONVERT (-ULTRA) 37/63

(Original)

Deutsch | Änderungen vorbehalten!

Serviceauftragsnummer:

Gerätetyp:

Herstell-Nr.:

Installateur:

Firma:

Strasse:

PLZ / Ort

Tel.Nr.:

Anlagenadresse:

Ansprechpartner:

Strasse:

PLZ / Ort

Tel.Nr.:

☐ mangelfrei☐ Leichte Mängel / Nachbesserung ohne neue Inbetriebnahme**Bemerkungen**

Inbetriebnahme erfolgreich durchgeführt?

☐ ja☐ nein

WOLF-Mitarbeiter: Name, Unterschrift

Kunde: Firma, Name, Unterschrift

Mit der Unterschrift bestätigt die inbetriebnehmende Firma die ordentliche Inbetriebnahme und der Anlagenbetreiber / Auftraggeber die Übergabe der Anlage.

Systemaufbau:

Typ	Anzahl
CAT-2-CONVERT 37	
CAT-2-CONVERT 63	
CAT-2-CONVERT 37-ULTRA	
CAT-2-CONVERT 63-ULTRA	

Zubehör:

elektrischer Durchlauferhitzer / E-Modul

Heizkreise:

Heizkörper

Hydraulisch abgeglichen

Wasseranalyse vorhanden	Ja	Nein
Wasseraufbereitung vorhanden	Ja	Nein
HT-Abgang (z. B. Badheizkörper)	Ja	Nein
Hydraulischer Abgleich	Ja	Nein
Ausdehnungsgefäß Primärkreis vorhanden	Ja	Nein
Anlage entlüftet	Ja	Nein
Hydraulischer Abgleich	Ja	Nein
Sonstig:.....	Ja	Nein
Betriebsanleitung für die Fachkraft ist an der Anlage	Ja	Nein

Heizungswasser:

	Leitfähigkeit		Härte		pH Wert
	Fülldruck				

Leitungswasser:

	Leitfähigkeit		Härte		pH Wert
----------------------	---------------	----------------------	-------	----------------------	---------

1.	Prüfen der Wohnungsstation	Geprüft:	Bemerkung/Werte:
1.1	Stromanschluss i. O.		
1.2	Sicherheitsmessung nach VDE 0701 bestanden		
1.3	Spannungsversorgung geprüft		Volt:
1.4	Position und Verdrahtung der Fühler geprüft		
1.5	Station auf Dichtigkeit geprüft		

1.	Prüfen der Wohnungsstation	Geprüft:	Bemerkung/Werte:
1.6	Sicherheitseinrichtungen geprüft		
1.7	Absperreinrichtungen geprüft		
1.8	Durchflussmengen kontrollieren		
1.9	Funktionsprüfung der Stellgeräte		

2.	Prüfen der Installation	Geprüft:	Bemerkung/Werte:
2.1	Vor- und Rücklauf Primärkreis richtig eingebunden		
2.2	Vor- und Rücklauf Sekundärkreis richtig eingebunden		
2.3	Heizkreise und bauseitigen Heizkreisverteiler geöffnet		
2.4	Radiatorenkreis		Stück

3.	Prüfen der Temperaturen	Geprüft:	Werte:
3.1	Primärtemperatur Vorlauf geprüft		°C
3.2	Primärtemperatur Rücklauf geprüft		°C
3.3	Vorlauftemperatur Heizkreis geprüft		°C
3.4	Warmwassereinstellung		°C
3.5	Warmwasseraustritt geprüft		°C
3.6	WW-Durchfluss gemessen, bei folgender WW-Temp. :		Liter/min

4.	Unterrichten des Benutzers	Geprüft:	Bemerkung:
4.1	Anlagenbetreiber eingewiesen und Anlage übergeben		
