



Luftreiniger AirPurifier AP ☐ / AP max ☐

**ANFORDERUNG
EINBRING- & AUFSTELLSERVICE
CHECKLISTE & ÜBERGABEPROTOKOLL**



Email: PK-Versand-Inland@wolf.eu
Tel.: 08751-74-1187
Fax: 08751-74-1613

Vom Besteller auszufüllen:

Webshop Bestellnummer:

Betreiber des Gerätes:

Standort des Gerätes:

Postleitzahl / Ort:

Straße:

Gebäude / Stockwerk:

Name der Kontaktperson:

Telefon:

Mobil:

**Aufstellposition im Raum
ist festgelegt (siehe Skizze)**


**Anschlusskabel am Gerät
mit Schukostecker 3m lang**

(Kabelverlängerung max. 10m,
Querschnitt 3 x 1,5 mm²)

Luftvolumenstrom AP: 150 - 1200 m³/h

Luftvolumenstrom AP max: 180 - 1250 m³/h

Wenn keine Vorgabe gemacht wird, wird
werksseitig Stufe 4 (●●●●) eingestellt.

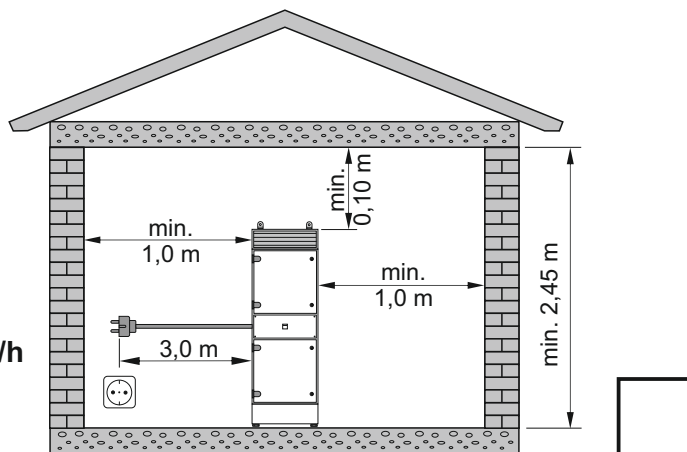

Stufe	●●	●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●●	●●●●●●●
AP:	☐ 150 m ³ /h	☐ 385 m ³ /h	☐ 690 m ³ /h	☐ 1000 m ³ /h	☐ 1200 m ³ /h	
AP max:	☐ 180 m ³ /h	☐ 450 m ³ /h	☐ 750 m ³ /h	☐ 1050 m ³ /h	☐ 1250 m ³ /h	

Raumgrundfläche Aufstellraum (m²):

Raumhöhe (m):

Datum

Name ggf. Firmenstempel

Unterschrift / Signatur



**ANFORDERUNG
EINBRING- & AUFSTELLSERVICE
CHECKLISTE & ÜBERGABEPROTOKOLL**




Email: PK-Versand-Inland@wolf.eu
Tel.: 08751-74-1187
Fax: 08751-74-1613

Vom Aufstellservice auszufüllen:

WOLF-Auftragsnummer:

Geräteseriennummer:


Demontage und
Montage des
Gerätes aus
Transportgründen,
bei Bedarf
(z.B. Aufzug)

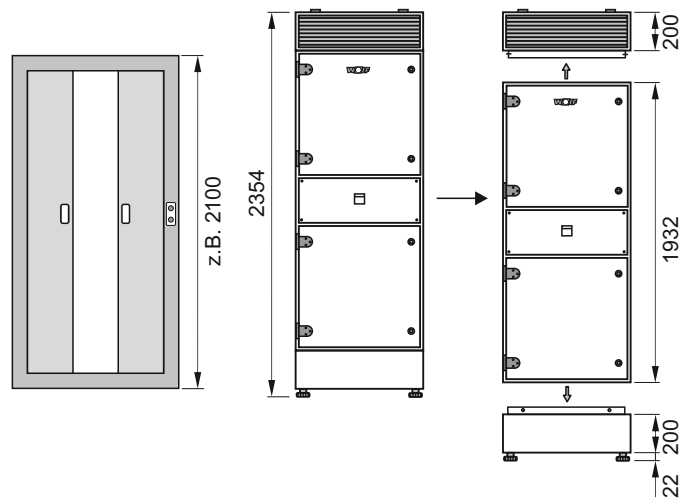


Gewicht verpackt: 218 kg
Gewicht unverpackt: 195 kg



Kippsicherung

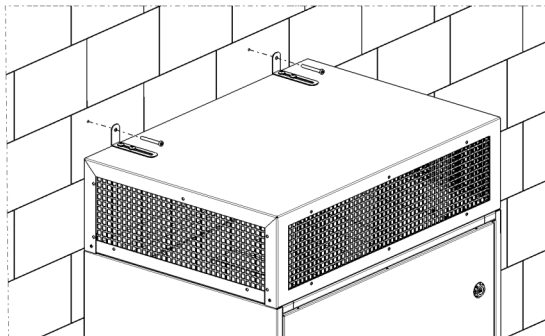

Schutzfolie HEPA-Filter
entfernen

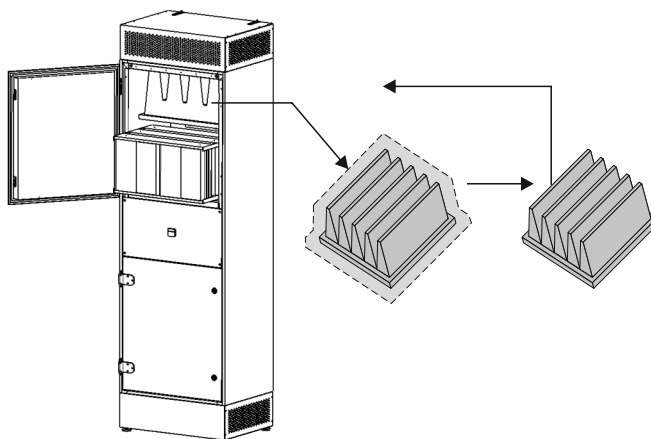



**ANFORDERUNG
EINBRING- & AUFSTELLSERVICE
CHECKLISTE & ÜBERGABEPROTOKOLL**






Email: PK-Versand-Inland@wolf.eu
Tel.: 08751-74-1187
Fax: 08751-74-1613

Vom Aufstellservice auszufüllen:

Einweisung

Betriebsschalter, Boost-Taster, Differenzdruckmanometer, Potentiometer, Wartung



Luftvolumenstrom:

Bei der Geräteaufstellung am Potentiometer einzustellender bzw. eingestellter Luftvolumenstrom, entsprechend des Raumvolumens des Aufstellraumes und der gewünschten Luftwechselrate und den Vorgaben des Bestellers (Seite 1).

Stufe

AP

AP max

●●

☐

150 m³/h

180 m³/h

●●●

☐

385 m³/h

450 m³/h

Raumgrundfläche (m²): _____ Raumvolumen (m³): _____

Raumhöhe (m): _____

●●●●

☐

690 m³/h

750 m³/h



(Siehe Betriebsanleitung Seite 21)

●●●●●

☐

1000 m³/h

1050 m³/h

Wenn keine Vorgabe gemacht wurde,
ist werkseitig Stufe 4 (●●●●) eingestellt.

●●●●●●

☐

1200 m³/h

1250 m³/h

Beispiel:

Raumgrundfläche (6 m x 8 m): 48 m²

Raumhöhe: 3 m

Raumvolumen: 144 m³

Gewünschte Luftwechselrate: 4-fach


Einzustellender Luftvolumenstrom: 144m³ x 4 = 720 m³/h

Betriebs-
anleitung



und

Revisionstür-
schlüssel



übergeben



Datum

Name eingewiesene Person

Unterschrift / Signatur

Name ggf. Firmenstempel

Unterschrift / Signatur
