ANFRAGEFORMULAR FÜR SONDERSPEICHER

Citrin Solar®
Energie- und Umwelttechnik

vertrieb@citrinsolar.de
Fax: +49 8761 334042

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Bauvorhaben

Telefon

E-Mail

Fachfirma

SPEICHERTYP

☐ Heizwasserspeicher ☐ PN 3
☐ Kältespeicher ☐ PN 6

ISOLIERUNG

Faservlies (Enddämmstärke mm): ☐ 100 ☐ 120 ☐ 140 ☐ 200 ☐ 220 ☐ 240
Armaflex (mm): ☐ 19 ☐ 32
Steinwolle (mm): ☐ 100 ☐ 150 ☐ 200 ☐ 250
Mantelmaterial: ☐ PP ☐ Alublech ☐ Edelstahlblech

AUFSTELLORT

☐ Raumaufstellung ☐ Außenaufstellung

FUSSKONSTRUKTION

_____ mm Bodenfreiheit

☐ Füße ☐ Standring ☐ Standrohre

SONDERMASSE

Durchmesser ohne Isolierung (mm): ☐ 500 ☐ 650 ☐ 750 ☐ 790 ☐ 850 ☐ 990
☐ 1100 ☐ 1250 ☐ 1400 ☐ 1600 ☐ 1800 ☐ 2000 ☐ _____

Höhe o. Isolierung: _____ mm
Inhalt: _____ l
Kippmaß: _____ mm
Raumhöhe: _____ mm

MUFFEN IG

	½ ″ DN 15	Stück:
	¾ ″ DN 20	Stück:
	1 ″ DN 25	Stück:
	1 ¼ ″ DN 32	Stück:
	1 ½ ″ DN 40	Stück:
	2 ″ DN 50	Stück:
	2 ½ ″ DN 65	Stück:
	3 ″ DN 80	Stück:
		Stück:

GLATTROHR-WÄMETAUSCHER

aus ST 37-2, Anschluss 1 ″

☐ 2,0 m² ☐ 3,0 m² ☐ 4,3 m²
☐ 5,1 m² ☐ 6,0 m² ☐ _____ m²

WELLROHRKORB

Einzel ☐ 20 m ☐ 26,8 m
☐ 32,5 m ☐ 40 m
Doppel ☐ 2x 26,8 m ☐ 2x 32,5 m
☐ 2x 40 m

EINBAUTEN

Rücklaufschichtrohr: _____ Stück
Schichttrennscheibe: _____ Stück
Wendebogen: _____ Stück
Leitrohre : _____ Stück
Düsenrohr: _____ Stück
Sphärentauscher : _____ Stück
_____ : _____ Stück
_____ : _____ Stück

ANBAUTEN

Fühlerklemmleiste: _____ Stück
Entleerung herausgef. _____ Stück
Entlüftung herausgef. _____ Stück
Haltebolzen _____ Stück
_____ : _____ Stück

FLANSCHSTUTZEN

☐ PN 6 ☐ PN 16

	DN 25	Stück:
	DN 32	Stück:
	DN 40	Stück:
	DN 50	Stück:
	DN 65	Stück:
	DN 80	Stück:
	DN 100	Stück:
	DN 125	Stück:
	DN 150	Stück:
	DN 200	Stück:
	DN 250	Stück:
	DN 300	Stück:
		Stück:

EINSCHWEISSFLANSCH

	DN 110, LK 150, 8xM12	Stück:
	DN 180, LK 210, 10xM10	Stück:
	DN 180, LK 225, 12xM12	Stück:

REVISIONSÖFFNUNGEN

	Mannloch DN320x420	Stück:
	Handloch DN110	Stück:
	Handloch DN180	Stück:

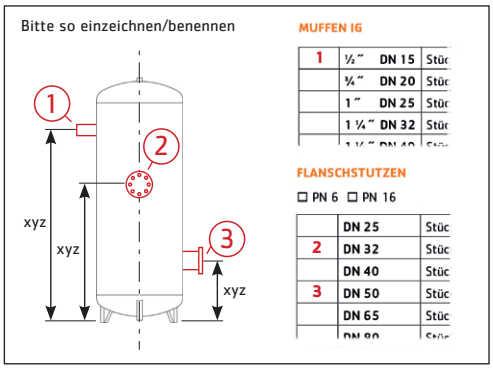

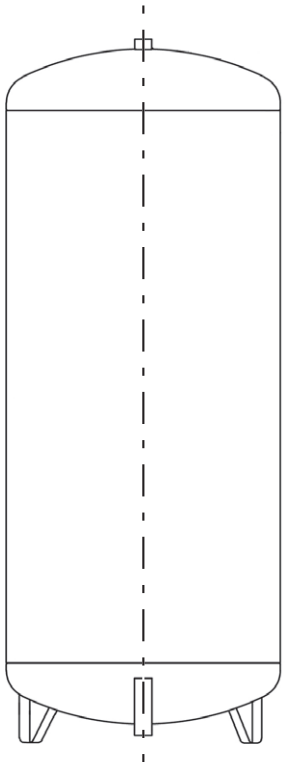

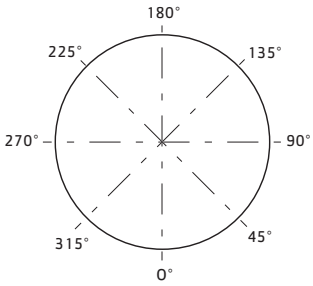

Sonstige Anmerkungen:
